

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 6 месяцев 2025 года				
№	Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Примечание
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года, тыс.тенге	7 522 265,71	853 432,00	
1	Строительство нового золоотвала	2 842 775,17	219 272,49	В процессе
2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»	1 468 233,08	469 221,90	В процессе
3	Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди	180 290,98	12 333,25	В процессе
4	Замена трубопроводов противодавления турбины Р-38-130/34 ПР1	490 943,00	0,00	Не подошел срок
5	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с замена паропроводящих труб	14 067,68	0,00	Не подошел срок
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 замена водоподводящих труб	58 254,73	0,00	Не подошел срок
7	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 замена завихрителей эмульгаторов	82 984,71	0,00	Не подошел срок
8	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 замена боковых экранов	280 897,73	0,00	Не подошел срок
9	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 замена заднего экрана	118 348,85	0,00	Не подошел срок
10	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 замена необогреваемых труб	46 120,51	0,00	Не подошел срок
11	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена пароперепускных труб от «холодного» пакета к ширмовому пароперегревателю	49 279,13	1 341,26	В процессе
12	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена паросборного коллектора	55 444,07	362,48	В процессе
13	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена пароперепускных труб от «выходного» пакета пароперегревателя	53 951,26	1 184,87	В процессе
14	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена паропроводящих труб экранов	216 886,62	5 528,07	В процессе
15	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 замена пароперепускных труб от барабана к потолочному пароперегревателю	47 839,45	0,00	В процессе
16	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 замена пароохладителя 1-й ступени	66 859,56	0,00	В процессе
17	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 замена фронтного экрана	485 511,11	144 187,68	В процессе
18	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 замена ширмового пароперегревателя	239 509,70	0,00	Не подошел срок
19	Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода	724 068,37	0,00	В процессе

Основной целью строительства золоотвала №5 является складирование золошлаковых отходов после заполнения существующего золоотвала №3. Новый золоотвал будет обеспечивать складирование золошлаковых отходов с учетом перспективного развития станции.

В период с 01.02.2025 года по текущий момент выполнены следующие работы:

- Работы по эстакаде золопроводов;
- Работы по монтажу водосбросных колодцев;
- Работы по колодцу дренажной системы;
- Изготовление служебных мостиков и лестниц для водосбросных колодцев;
- Выполняются земляные работы по выемке и по устройству дамбы золоотвала и бассейна осветленной воды;
- Выполняются работы по укладке геомембраны.



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.

В 2025 году в рамках 5 этапа выполняется замена участка главного паропровода к котлоагрегату ст.№11 и к котлоагрегату ст.№12 с выносом паропроводов с галереи топливоподачи.

На сегодняшний день выполняются работы по обвязке колонн котлоагрегата ст.№12, выполнена продувка нитки Б паропровода котлоагрегата ст.№11, выполнили гидравлику нитки Б. По нитке А ведутся работы по опорам и сварке расходомерной шайбы.



Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди

По данной работе на сегодняшний день выполнен монтаж коллекторов впрыска перемычки и ТГ-9.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11



С 25 апреля по 20 июля выполняется средний ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой пароперепускных труб от холодного пакета к ширмовому пароперегревателю, паросборного коллектора, пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к ПСК, пароотводящих труб экранов.

Замена пароперепускных труб от холодного пакета к ширмовому пароперегревателю – ведутся работы по пароперепускных труб.

Замена паросборного коллектора – выполнен монтаж ПСК и гарнитуры.

Замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к ПСК – произведен монтаж пароперепускных труб от ПСК к ГПК. Произвели монтаж пароперепускных труб от ВПП к ПСК. Выполняется контроль стыков.

Замена пароотводящих труб экранов – произведен демонтаж тепловой изоляции всех пароотводящих труб. Ведется монтаж пароотводящих труб фронтного, заднего и боковых экранов.

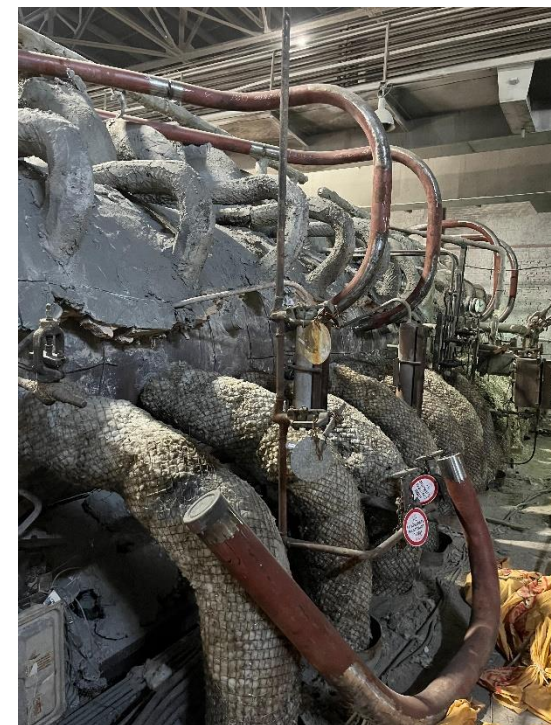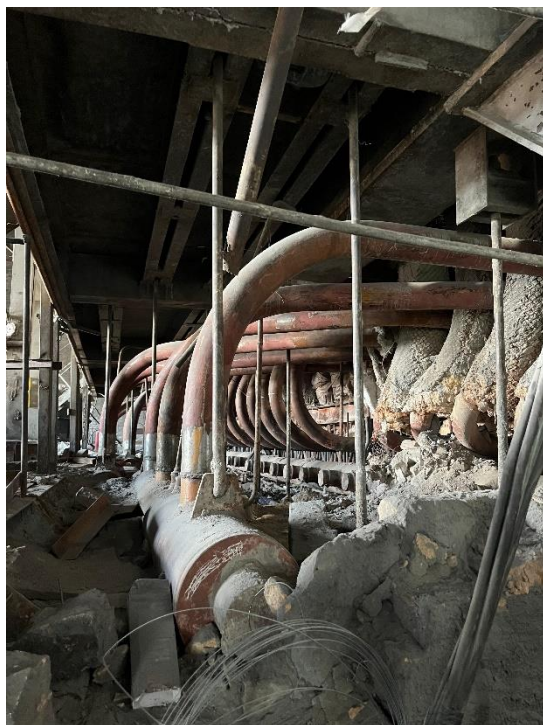

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12

С 14 июня по 10 августа выполняется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароперепускных труб от барабана к потолочному пароперегревателю, пароохладителя 1-й ступени.


Замена пароперепускных труб от барабана к потолочному пароперегревателю – выполнены работы по демонтажу тепловой изоляции.

Замена пароохладителя 1-й ступени – выполняются работы по демонтажу тепловой изоляции.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13

С 19 апреля по 15 августа выполняется средний ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой фронтного экрана. Замена фронтного экрана – произведен монтаж всех блоков экранных труб на верхних и нижних отметках. Ведется монтаж экранных труб на средних отметках.

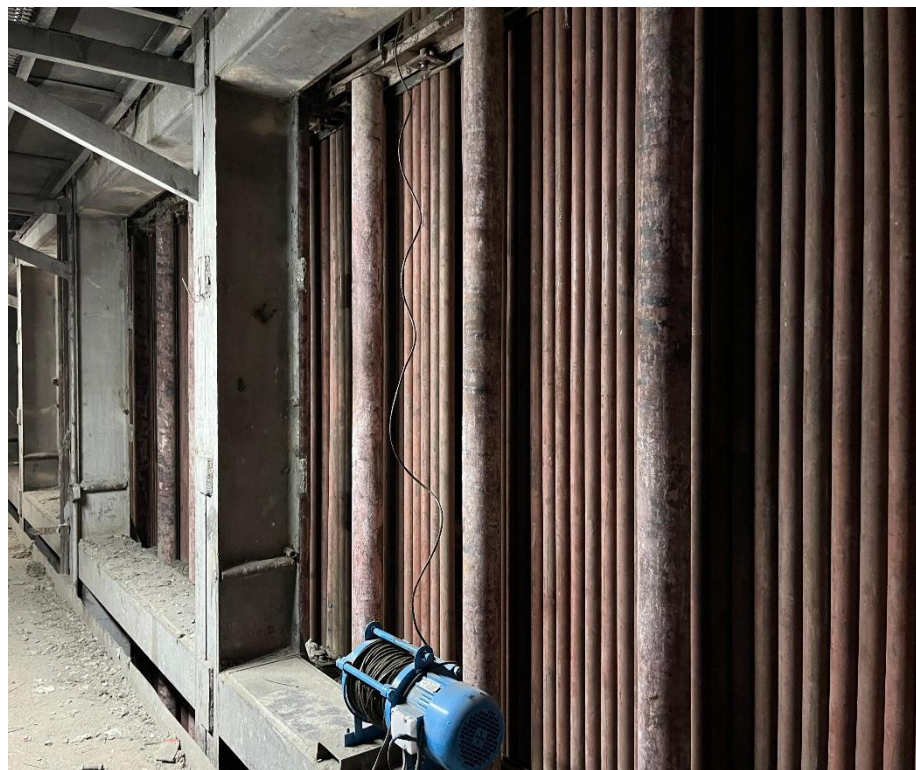

Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода

Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода выполняется по участкам и разделена на 3 этапа. В 2025 году выполняются работы в рамках 1 этапа.

На сегодняшний день производятся работы на камерах котлована. Ведутся подготовительные работы к заливке стен камер. Продолжают земляные работы на камерах.

