


Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 6 месяцев 2026 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 30
декабря 2025 года №256-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 5 января 2025 года №67

№	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на 2026 год			6 235 005,59	452 310,50	
1	Реконструкция II-IV очереди здания главного корпуса	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2	2026г	1 548 860,75	181 428,37	В процессе
2	Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди		2026г	400 000,00	0,00	Не подошел срок
3	Реконструкция АСУ ТП котлоагрегата ст.№14		2026г	224 785,71	0,00	В процессе
4	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7 с заменой воздухоподогревателя 1,2 ступени		2026г	165 642,17	185 565,56	В процессе
5	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой водяного экономайзера 1 ступени		2026г	541 561,11	17 452,18	В процессе
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой фронтного экрана		2026г	566 540,94	0,00	В процессе
7	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароперепускных труб от ВПП к ПСК		2026г	63 107,25	4 130,95	В процессе
8	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароохладителя 2 ступени		2026г	78 659,47	1 735,47	В процессе
9	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой холодного пакета пароперегревателя		2026г	257 939,52	0,00	В процессе
10	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой пароохладителя 1 ступени		2026г	78 659,47	0,00	В процессе
11	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой задних блоков потолочного пароперегревателя		2026г	41 763,26	0,00	Не подошел срок
12	Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода		2026г	1 984 060,00	61 997,97	В процессе
13	Капитальный ремонт золопроводов		2026г	283 425,94	0,00	В процессе

Реконструкция II-IV очереди здания главного корпуса

Основной целью реконструкции II-IV очереди здания главного корпуса является устранение аварийного состояния строительных конструкций покрытия здания и обеспечение сейсмобезопасности. Реализация проекта рассчитана на 3 этапа начиная с 2025 по 2027 годы. В 2026 году выполняется реализация 2 этапа.

В рамках реализации проекта выполняются следующие работы: демонтаж с заменой кирпичных стен, на сэндвич-панели; вынос сетей, коммуникаций на демонтируемых стенах; демонтаж с заменой плит покрытия кровли на сэндвич; устройство ж/б монолитного цокольного пояса; демонтаж (монтаж) окон.

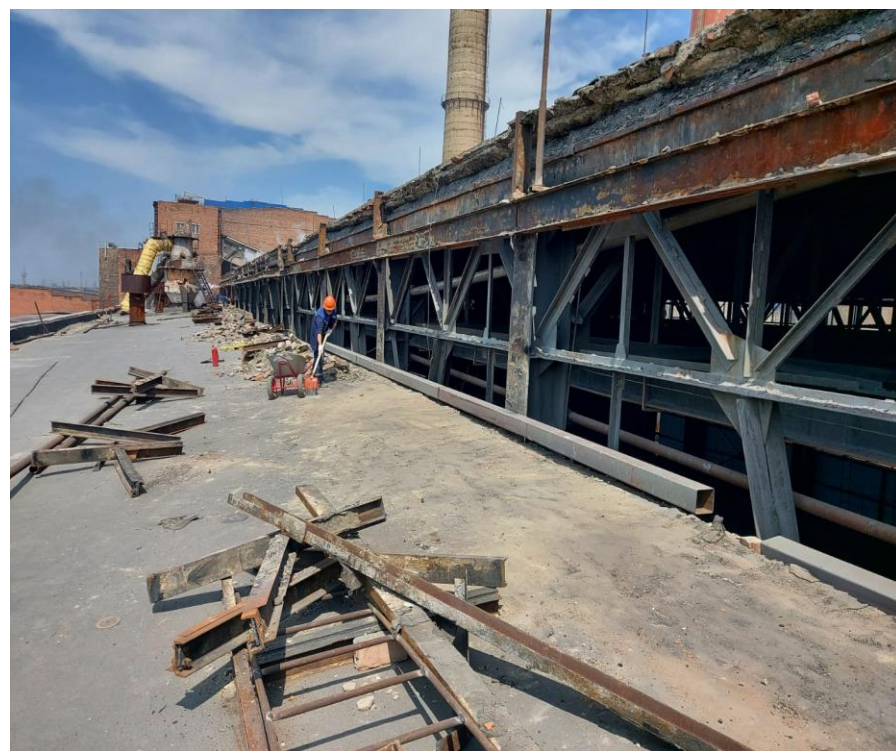


Реконструкция АСУ ТП котлоагрегата ст.№14

Модернизации АСУ ТП котлоагрегата ст.№14 позволит обеспечить повышение уровня безопасности и безаварийности технологического процесса, требуемую точность, достоверность и своевременность предоставляемой персоналу оперативной информации. На сегодняшний день заключен договор, ожидается поставка оборудования, сроки поставки основного оборудования – конец июля.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7


С 1 апреля по 14 июня выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7 с заменой воздухоподогревателя 1,2 ступени.

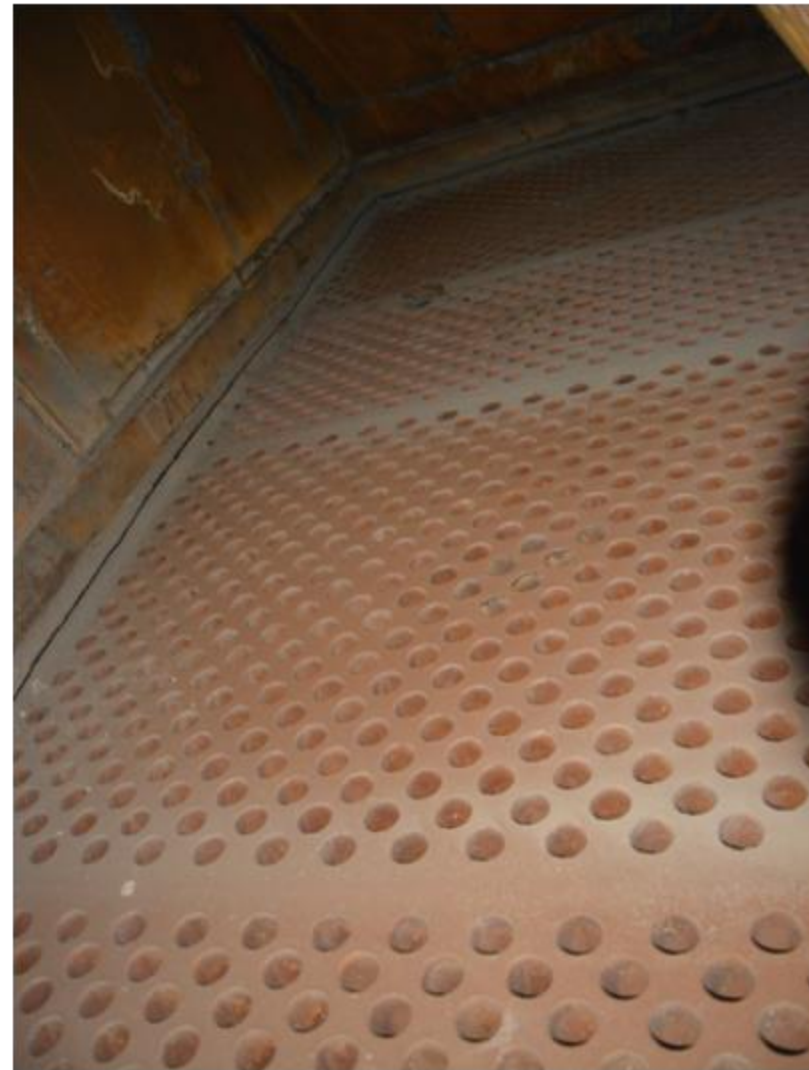

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11

С 10 апреля по 20 июля выполняется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой водяного экономайзера 1 ступени.

Замена водяного экономайзера 1 ступени – выполнены работы по монтажу водяного экономайзера 1 ступени, заварены все трубы кроме подводящего трубопровода к коллектору ВЭК и дренажей коллекторов.

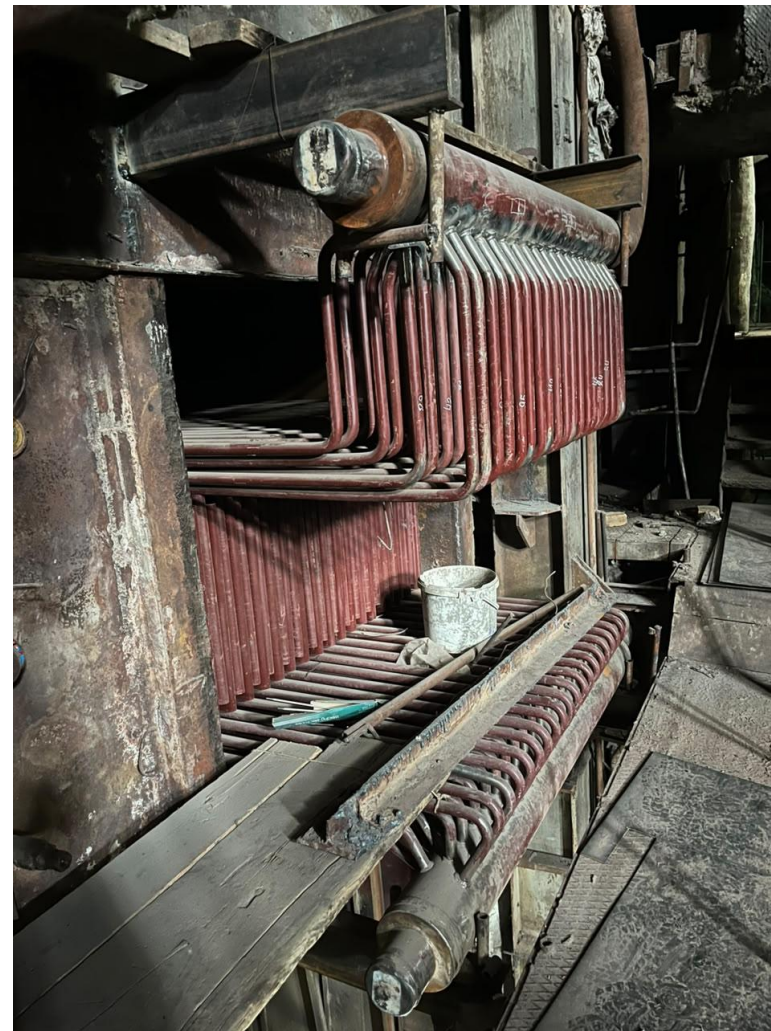


Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12

С 25 апреля по 15 июля выполняется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к ПСК, пароохладителя 2 ступени.

Замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к ПСК – монтаж завершен.

Замена пароохладителя 2 ступени – установлены на проектное места коллектора, приняты все стыки, остались впрыски, импульсные линии и опоры коллекторов.

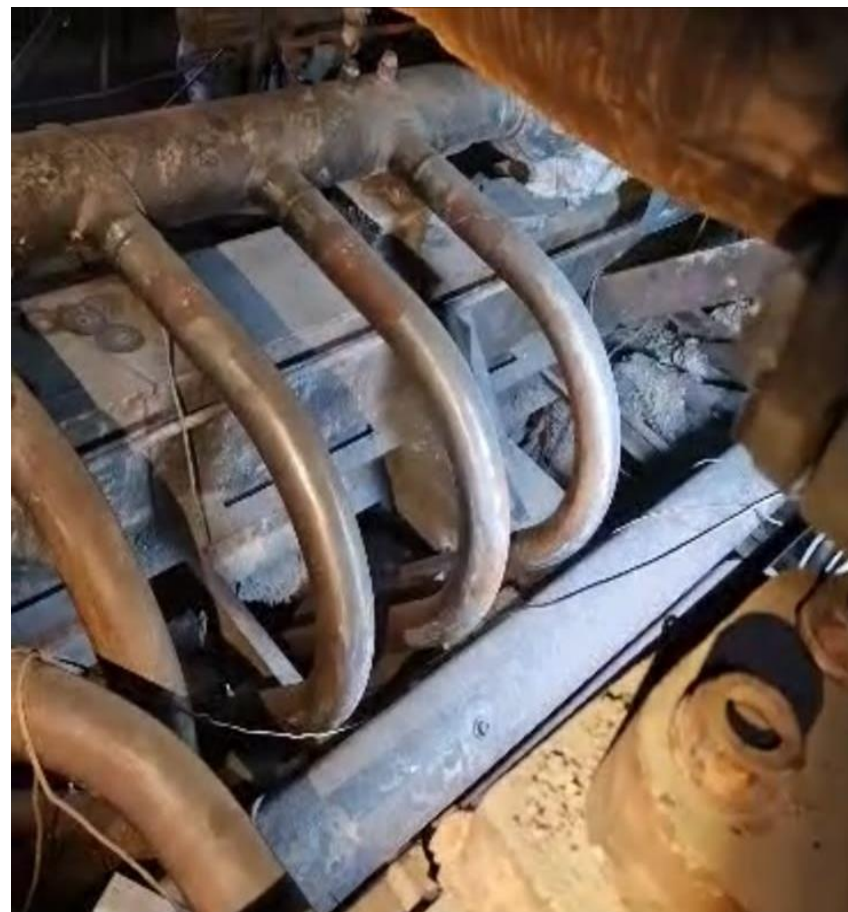

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13

С 10 мая по 30 июля выполняется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой пароохладителя 1 степени. Замена пароохладителя 1 степени – монтаж завершен, ведутся работы по восстановлению тепловой изоляции.



Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода

Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода выполняется по участкам и разделена на 3 этапа. В 2026 году выполняются работы в рамках 2 этапа.

На сегодняшний день производятся работы по монтажу трубопровода между камерами. Приступают к выполнению земляных работ на камерах. А также планируется приступить к механической очистке металлическим ершом участка трубопровода между камерами.



Капитальный ремонт золопроводов

На сегодняшний день производятся работы по капитальному ремонту золопроводов, выполнена замена золопровода №3 протяженностью 1500м из 1800м.

