

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 6 месяцев 2023 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 июня 2023 года №77-ОД и
Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 21 июня 2023 года №135**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года			3 504 763,39	201 647,87	
1	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2		1 350 000,00	82 727,39	
1.1.	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2023г	1 350 000,00	82 727,39	<i>В процессе</i>
2	Модернизация и Реконструкция		2023г	348 653,00	65 234,56	
2.1.	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2023г	348 653,00	65 234,56	<i>В процессе</i>
3	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2023г	1 363 138,39	53 685,92	
3.1.	<i>Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9</i>		2023г	58 644,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.2.	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>		2023г	142 000,00	36 012,12	<i>В процессе</i>
3.3.	<i>Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана</i>		2023г	163 133,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.4.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой пароперегревателя</i>		2023г	29 766,36	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.5.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой воздухоподогревателя</i>		2023г	20 631,75	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.6.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя</i>		2023г	34 615,00	16 420,67	<i>В процессе</i>
3.7.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя</i>		2023г	715 534,28	1 253,13	<i>В процессе</i>
3.8.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой "холодной" части воздухоподогревателя</i>		2023г	160 814,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.9.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от "выходного" пакета пароперегревателя к коллектору ПСК</i>		2023г	38 000,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
4	Приобретение основных средств		2023г	442 972,00	0,00	
4.1.	<i>Приобретение питательных электронасосов с установкой</i>		2023г	141 669,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
4.2.	<i>Приобретение основных средств</i>		2023г	301 303,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>

Строительство нового золоотвала

Проведены подготовительные работы (частичная выемка и перевозка грунта, ограждение территории).
Произведена поставка труб ПЭ 100 710*52 мм, общая длина 4 588 метров.
Выполнены проколы под ЖД путями, проложены 5 футляров длиной 50 метров.

до



после



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.

В 2023 году выполняется замена по 3 этапу - участок магистрального паропровода $\text{Ø}377*50$ мм от подключения КА-13,14 к магистрали в сторону турбоагрегата ст.№12 и РОУ-14,15, котлоагрегата ст.№15

до



после





Капитальный ремонт золопроводов

В 2023 году запланирован капитальный ремонт золопроводов протяженностью Ду530мм – 2 060м, Ду325мм – 170м. Завершили монтаж участка золопровода №1 и №3 на территории ЮКО. Проводится демонтаж с помощью ж/д крана от ПК10 в сторону БН№3, срезали золопровод №1 на участке ПК10 до ПК14+50м

до



после

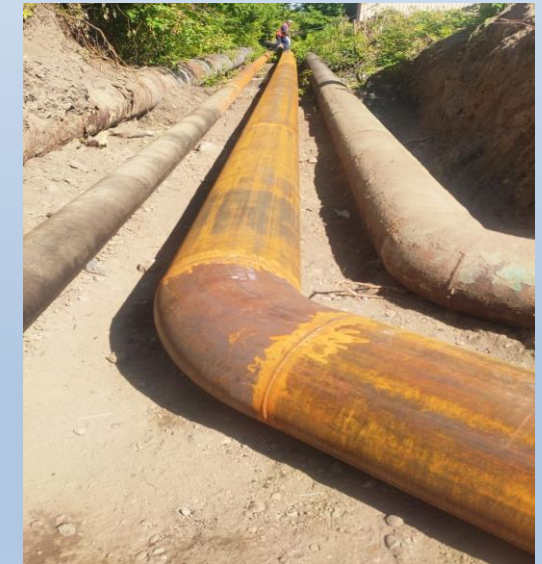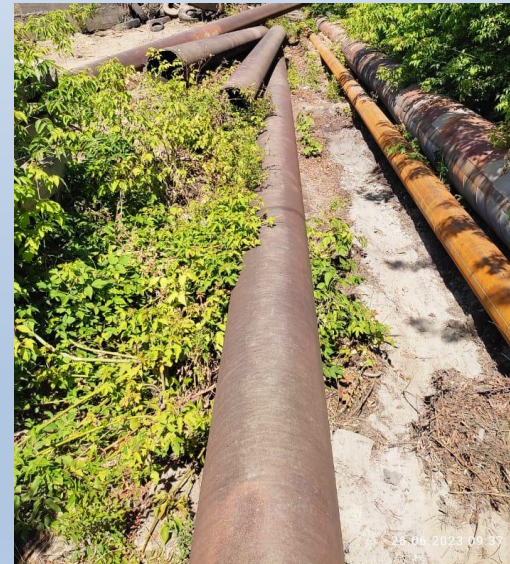

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя завершен.
Выполняются заключительные работы по восстановлению теплоизоляции.

до



после



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя



Выполнен демонтаж теплоизоляции боковых и заднего экрана, короба уплотнения нижних коллекторов заднего экрана, проведены подготовительные работы к демонтажу экранов, выполняются работы по демонтажу экранов. Оборудование поставлено в полном объеме.

