

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 9 месяцев 2023 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 июня 2023 года №77-ОД и Управления
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 21 июня 2023 года №135**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года			3 504 763,39	2 155 164,23	
1	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 2		1 350 000,00	406 619,00	
1.1.	Строительство нового золоотвала		2023г	1 350 000,00	406 619,00	В процессе
2	Модернизация и Реконструкция		2023г	348 653,00	1 123 820,52	
2.1.	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»		2023г	348 653,00	1 123 820,52	Удорожание работ, оборудования и материалов
3	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2023г	1 363 138,39	624 724,71	
3.1.	Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9		2023г	58 644,00	0,00	Планируется подача заявки на корректировку ИП, мероприятие выполнится за счет нерегулируемых видов деятельности
3.2.	Капитальный ремонт золопроводов		2023г	142 000,00	0,00	Планируется подача заявки на корректировку ИП, мероприятие выполнится за счет нерегулируемых видов деятельности
3.3.	Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана		2023г	163 133,00	0,00	Планируется подача заявки на корректировку ИП
3.4.	Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой пароперегревателя		2023г	29 766,36	5 795,68	В процессе
3.5.	Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой воздухоподогревателя		2023г	20 631,75	13 683,63	В процессе
3.6.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя		2023г	34 615,00	32 961,59	В процессе
3.7.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя		2023г	715 534,28	566 523,78	В процессе
3.8.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой "холодной" части воздухоподогревателя		2023г	160 814,00	5 760,03	В процессе
3.9.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от "выходного" пакета пароперегревателя к коллектору ПСК		2023г	38 000,00	0,00	Планируется подача заявки на корректировку ИП, поставленная трубная продукция не прошла входной контроль, выявлены недопустимые дефекты, вследствие чего принято решение перенести выполнение данной работы на 2024 год
4	Приобретение основных средств		2023г	442 972,00	0,00	
4.1.	Приобретение питательных электронасосов с установкой		2023г	141 669,00	0,00	Планируется подача заявки на корректировку ИП, отказ от проекта в пользу более приоритетных работ
4.2.	Приобретение основных средств		2023г	301 303,00	0,00	Планируется подача заявки на корректировку ИП, отказ от проекта в пользу более приоритетных работ

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы на 2023 год в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»

Строительство нового золоотвала

Ведутся земляные работы по срезке свалки от ЗОН№5 до подстанции. Работают 2 экскаватора, 2 бульдозера и 6 самосвалов.

Произведена поставка труб Д 325 в количестве 88шт.

Пришли испытанные все отводы, запаяли 8 из 12. Планируется опрессовка участка от 3 до 4 камеры.



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.

В 2023 году выполнены работы по 3 этапу - участок магистрального паропровода Ø377*50 мм от подключения КА-13,14 к магистрали в сторону турбоагрегата ст.№12 и РОУ-14,15, котлоагрегата ст.№15.

до



после



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой пароперегревателя

В процессе выполнения работы по замене пароперегревателя котлоагрегата ст.№10. На сегодняшний день установлены коллектора, производятся работы по монтажу пакетов пароперегревателей, а также по монтажу труб от барабана к пароохладителю.

до




после




Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой воздухоподогревателя

В процессе выполнения работы по замене воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№10. Остались работы по восстановлению тепловой изоляции.

до

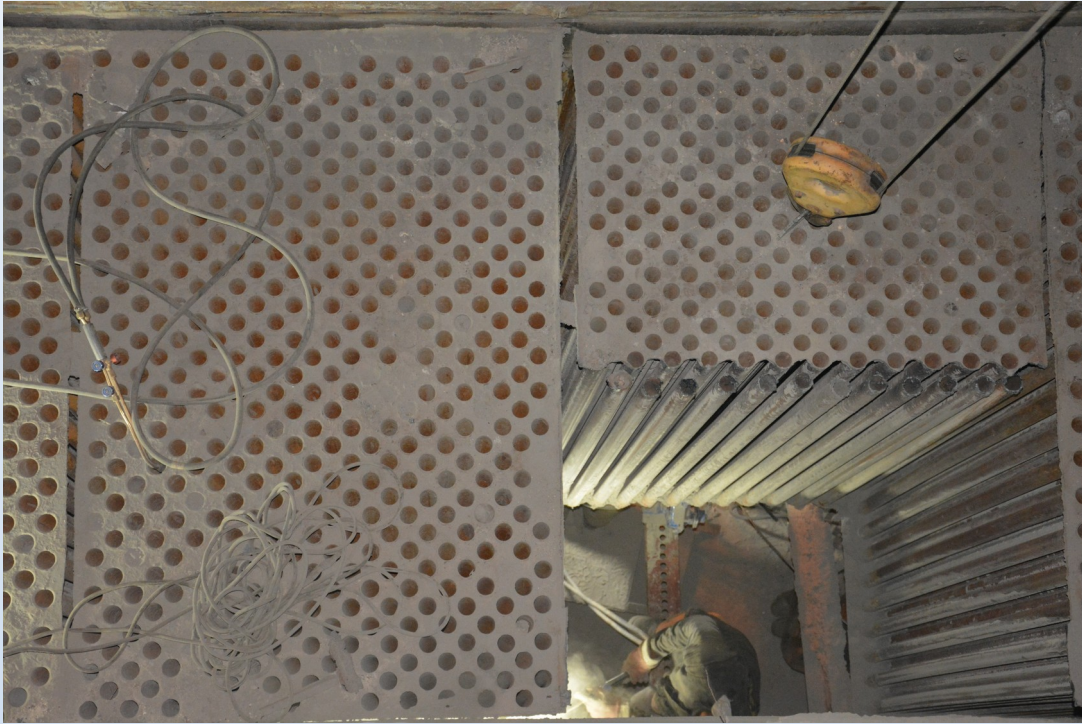

после

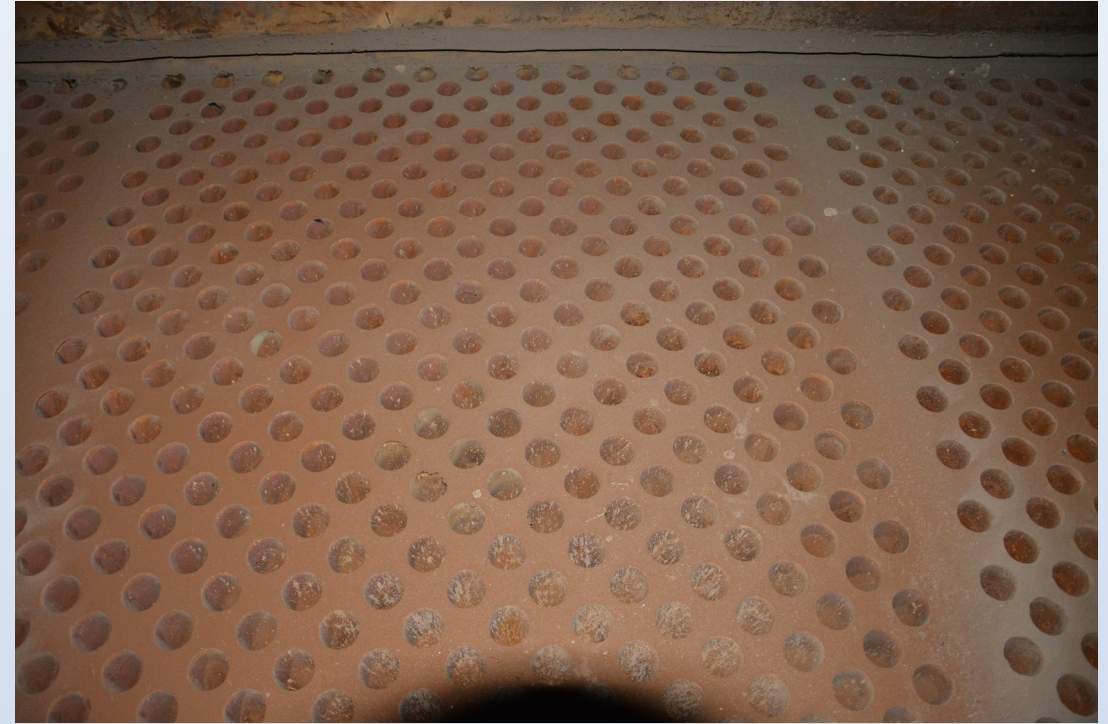

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя

Выполнены работы по замене ширмового пароперегревателя котлоагрегата ст.№12 с восстановлением тепловой изоляции.

до



после



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя

На данный момент производятся демонтажно-монтажные работы по замене экранов (боковые и задний) и радиационного пароперегревателя.

до



после



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой «холодной» части воздухоподогревателя

Выполнены работы по замене «холодной» части воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№14 с восстановлением тепловой изоляции.

до



после

