

**Информация субъекта естественной монополии**  
**о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 9 месяцев 2023 года**  
**утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 июня 2023 года №77-ОД и Управления**  
**энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 21 июня 2023 года №135**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года</b>			<b>3 504 763,39</b>	<b>2 155 164,23</b>	
<b>1</b>	<b>Строительство (расширение)</b>	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2		<b>1 350 000,00</b>	<b>406 619,00</b>	
1.1.	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2023г	1 350 000,00	406 619,00	<i>В процессе</i>
<b>2</b>	<b>Модернизация и Реконструкция</b>		2023г	<b>348 653,00</b>	<b>1 123 820,52</b>	
2.1.	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2023г	348 653,00	1 123 820,52	<i>Удорожание работ, оборудования и материалов</i>
<b>3</b>	<b>Капитальные ремонты (увеличение срока службы)</b>		2023г	<b>1 363 138,39</b>	<b>624 724,71</b>	
3.1.	<i>Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9</i>		2023г	58 644,00	0,00	<i>Планируется подача заявки на корректировку ИП, мероприятие выполнится за счет нерегулируемых видов деятельности</i>
3.2.	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>		2023г	142 000,00	0,00	<i>Планируется подача заявки на корректировку ИП, мероприятие выполнится за счет нерегулируемых видов деятельности</i>
3.3.	<i>Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана</i>		2023г	163 133,00	0,00	<i>Планируется подача заявки на корректировку ИП</i>
3.4.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой пароперегревателя</i>		2023г	29 766,36	5 795,68	<i>В процессе</i>
3.5.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой воздухоподогревателя</i>		2023г	20 631,75	13 683,63	<i>В процессе</i>
3.6.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя</i>		2023г	34 615,00	32 961,59	<i>В процессе</i>
3.7.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя</i>		2023г	715 534,28	566 523,78	<i>В процессе</i>
3.8.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой "холодной" части воздухоподогревателя</i>		2023г	160 814,00	5 760,03	<i>В процессе</i>
3.9.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от "выходного" пакета пароперегревателя к коллектору ПСК</i>		2023г	38 000,00	0,00	<i>Планируется подача заявки на корректировку ИП, поставленная трубная продукция не прошла входной контроль, выявлены недопустимые дефекты, вследствие чего принято решение перенести выполнение данной работы на 2024 год</i>
<b>4</b>	<b>Приобретение основных средств</b>		2023г	<b>442 972,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.	<i>Приобретение питательных электронасосов с установкой</i>	2023г	141 669,00	0,00	<i>Планируется подача заявки на корректировку ИП, отказ от проекта в пользу более приоритетных работ</i>	
4.2.	<i>Приобретение основных средств</i>	2023г	301 303,00	0,00	<i>Планируется подача заявки на корректировку ИП, отказ от проекта в пользу более приоритетных работ</i>	

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы на 2023 год в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»

Генеральный директор



Д.Т. Нугуманов

# Строительство нового золоотвала

Ведутся земляные работы по срезке свалки от ЗОН№5 до подстанции. Работают 2 экскаватора, 2 бульдозера и 6 самосвалов.

Произведена поставка труб Д 325 в количестве 88шт.

Пришли испытанные все отводы, запаяли 8 из 12. Планируется опрессовка участка от 3 до 4 камеры.



# Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.

В 2023 году выполнены работы по 3 этапу - участок магистрального паропровода Ø377\*50 мм от подключения КА-13,14 к магистрали в сторону турбоагрегата ст.№12 и РОУ-14,15, котлоагрегата ст.№15.

до



после



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой пароперегревателя

В процессе выполнения работы по замене пароперегревателя котлоагрегата ст.№10. На сегодняшний день установлены коллектора, производятся работы по монтажу пакетов пароперегревателей, а также по монтажу труб от барабана к пароохладителю.

до




после



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой воздухоподогревателя

В процессе выполнения работы по замене воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№10. Остались работы по восстановлению тепловой изоляции.

до

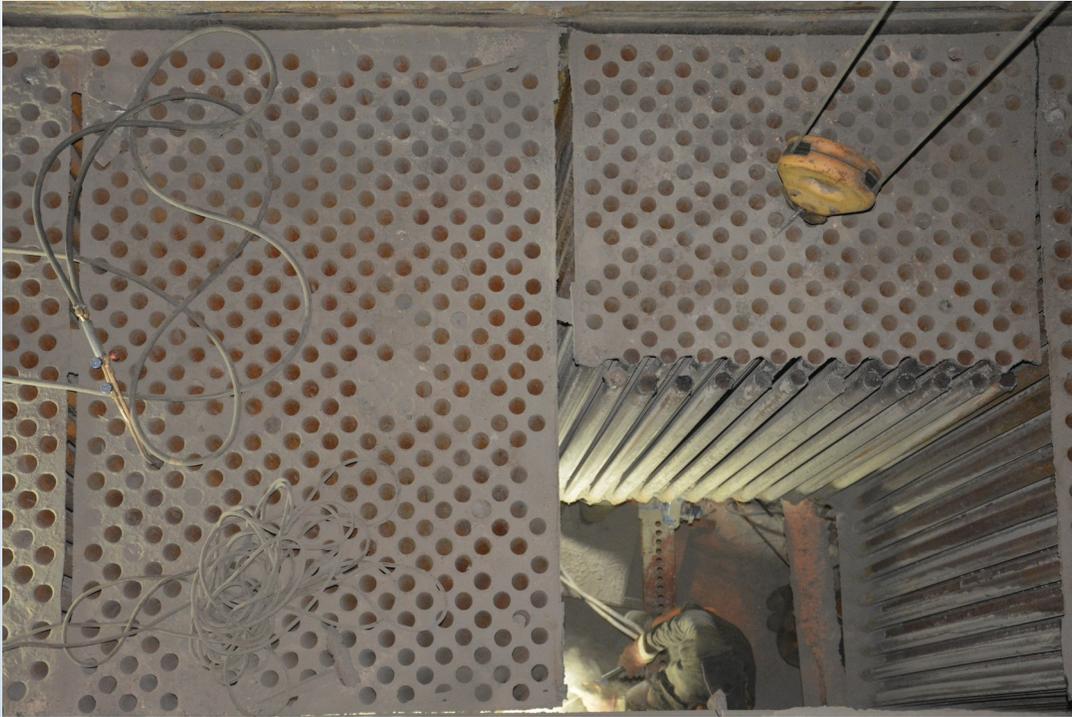

после



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя

Выполнены работы по замене ширмового пароперегревателя котлоагрегата ст.№12 с восстановлением тепловой изоляции.

до




после



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя

На данный момент производятся демонтажно-монтажные работы по замене экранов (боковые и задний) и радиационного пароперегревателя.

до

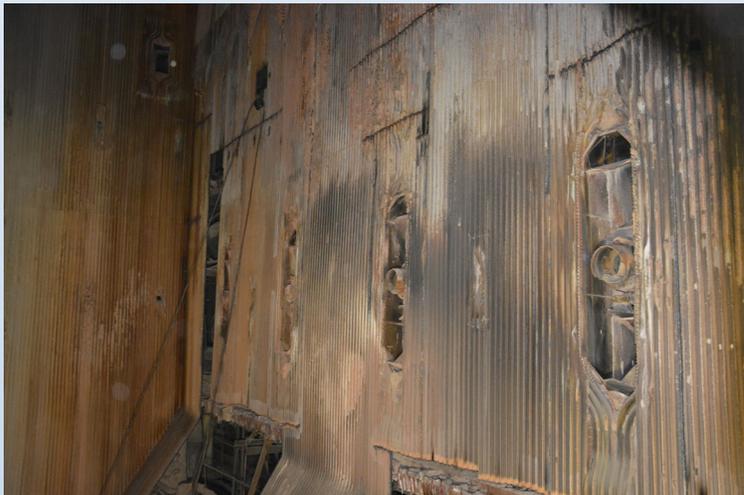

после



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой «холодной» части воздухоподогревателя

Выполнены работы по замене «холодной» части воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№14 с восстановлением тепловой изоляции.

до



после

