

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года**

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии), утверждена совместным приказом ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО" и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 21 декабря 2020 года 172-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч.:					
1	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 2		1 059 965	285 553	
1.1	Строительство нового золоотвала			241 332,23	10 717	
1.2	Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной		2021г	50 000,00	707	Выполняется
II	Модернизация и Реконструкция		2021г	191 332,23	10 010	Выполняется
2.1	Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО "УК ТЭЦ"		2021г	322 300,00	254 402	
2.2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»		2021г	12 000,00	12 500	Выполняется
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2021г	310 300,00	241 902	Выполняется
3.1	Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водопускных труб		2021г	496 332,36	20 434	
3.2	Капитальный ремонт к/а ст. № 15 с заменой конвективного пароперегревателя 1 ступени		2021г	220 830,36	20 434	Выполняется
			2021г	275 502,00	0	


Примечание: - В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» подготовлена корректировка утвержденной Инвестиционной программы на 2021 год

Генеральный директор

А.О. Бексолтан



Исп: Чотпанова Л.К.
Тел. (7232) 290-343

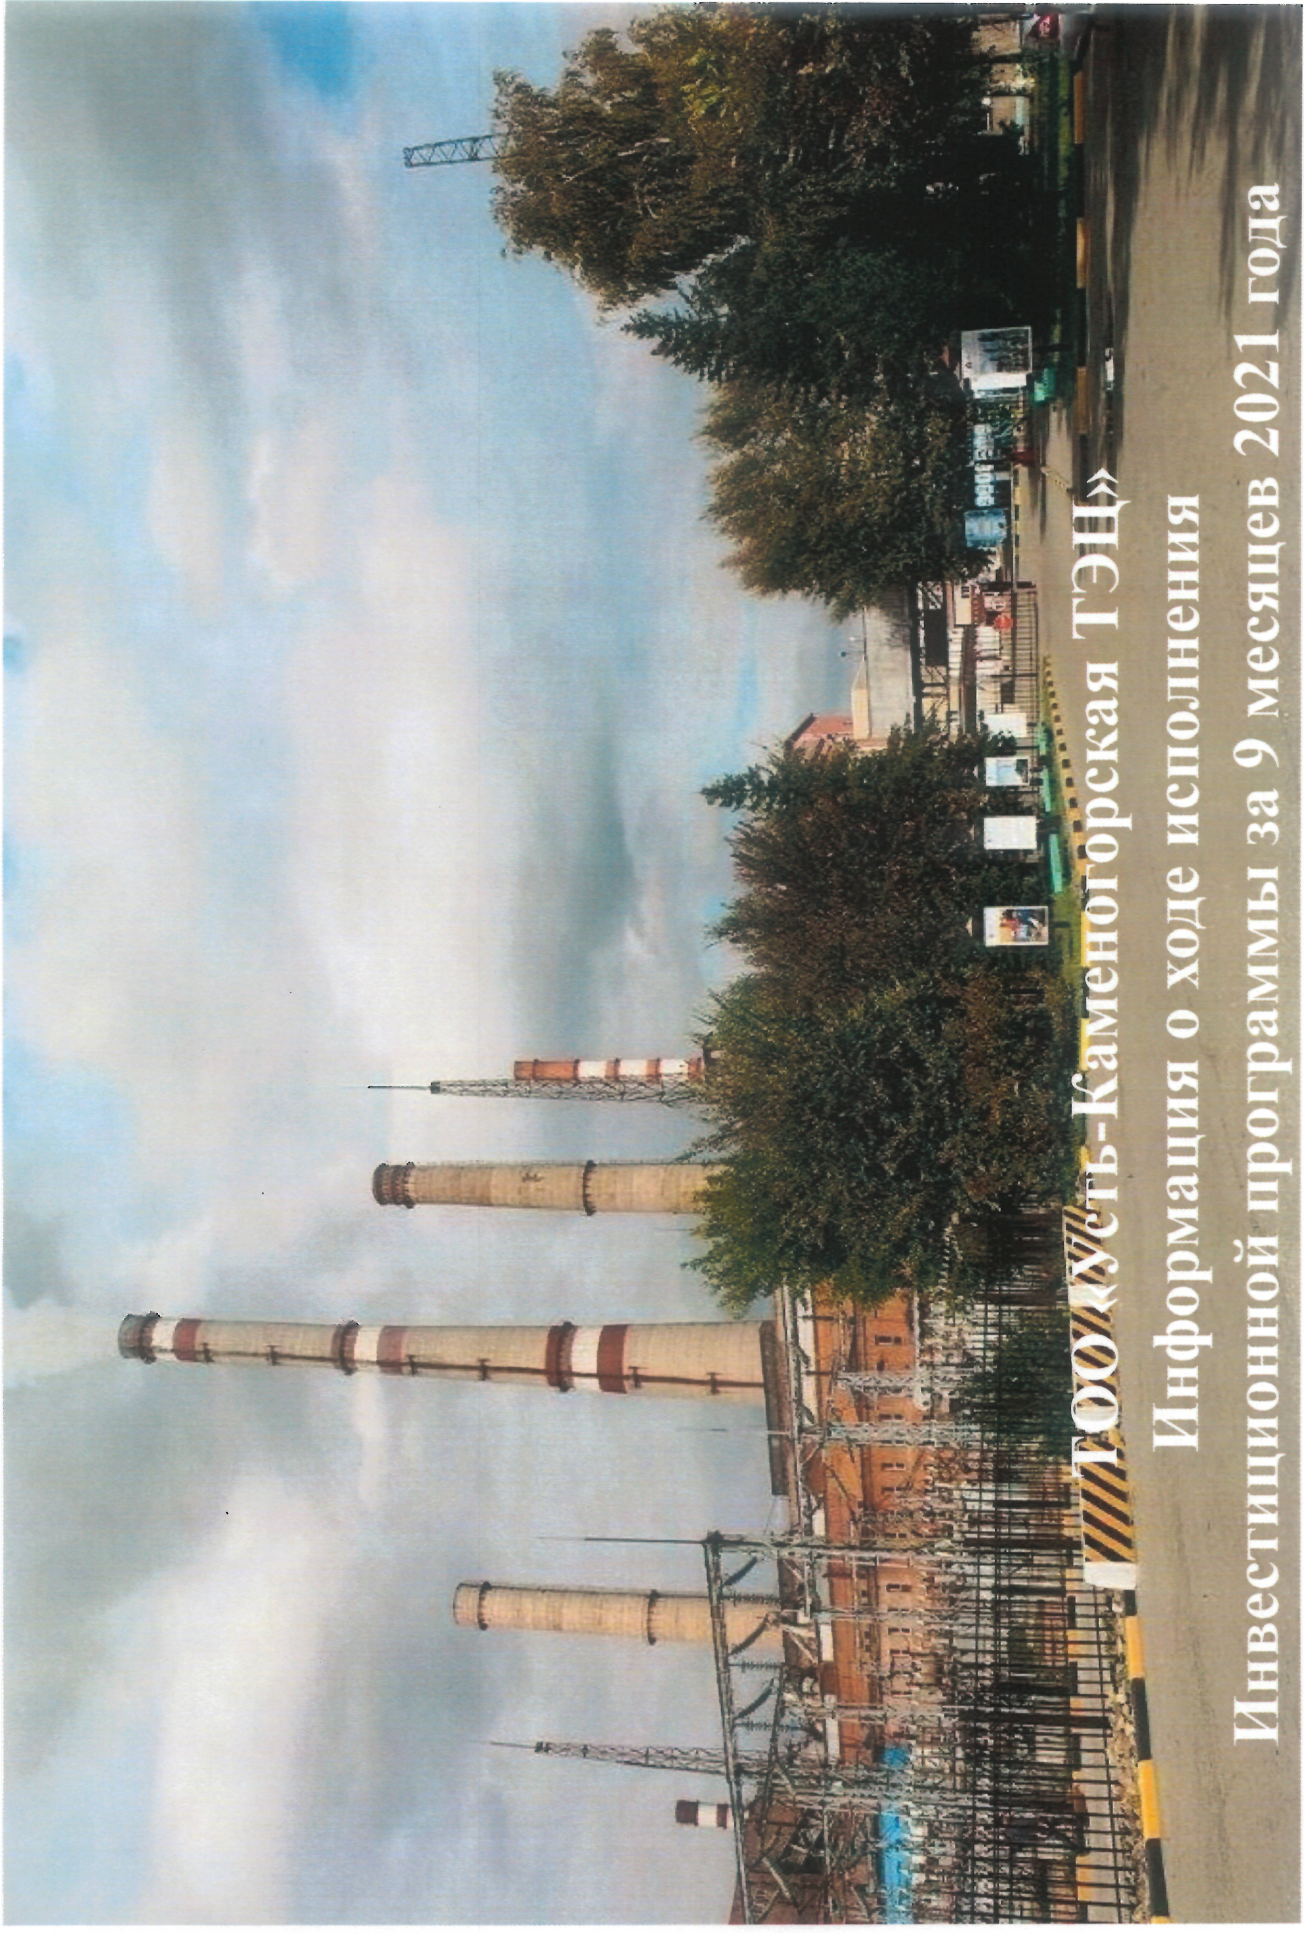


ГОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Информация о ходе исполнения

Инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года

Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

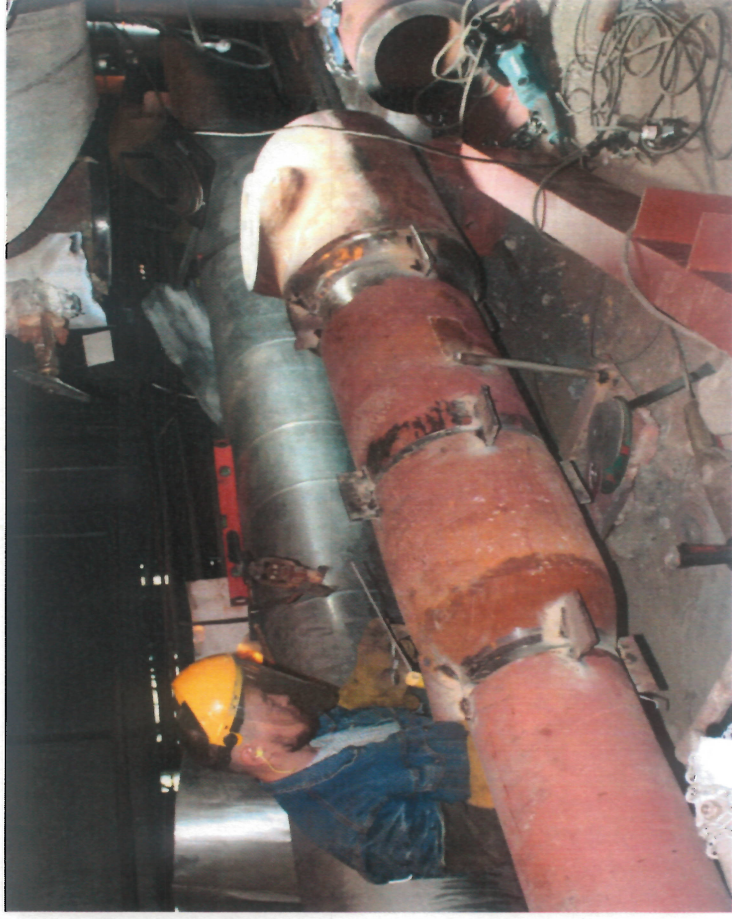

В процессе



В процессе

Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.

Выполнена замена участка магистрального паропровода от задвижки В I-1 до задвижки В I-3, подключение котлоагрегата ст.№11 и гиб на турбоагрегате ст.№9, заменен участок подключения котлоагрегата ст.№13 к паровой магистрали. На стадии завершения подключения котлоагрегата ст.№14 к паровой магистрали и наложение тепловой изоляции.

Замена паропровода позволит:

- снизить риск получения травм персоналом при эксплуатации паропровода.
- снизить риск недовыработки тепловой и электрической энергии.
- снизить риск повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;

Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной



В процессе



В процессе



В процессе

Выполнен монтаж кабельных лотков и монтаж силового кабеля, выполнена топографическая съёмка, проведено испытание кабеля, выполнена планировка грунта и восстановление дорожного покрытия.

Замена позволит:

- Обеспечить надежное электрическое питание и снизить риск аварийного отключения береговой насосной.
- Обновление физически устаревшего оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водопускных труб




В процессе

Выполнен демонтаж тепловой изоляции и демонтаж водопускных труб.
В процессе монтаж водопускных труб.

Замена позволит:

- Обеспечить надежную и безаварийную работу котлоагрегата в отопительный период.
- Снизить риск получения травм персоналом при обслуживании котлоагрегата.

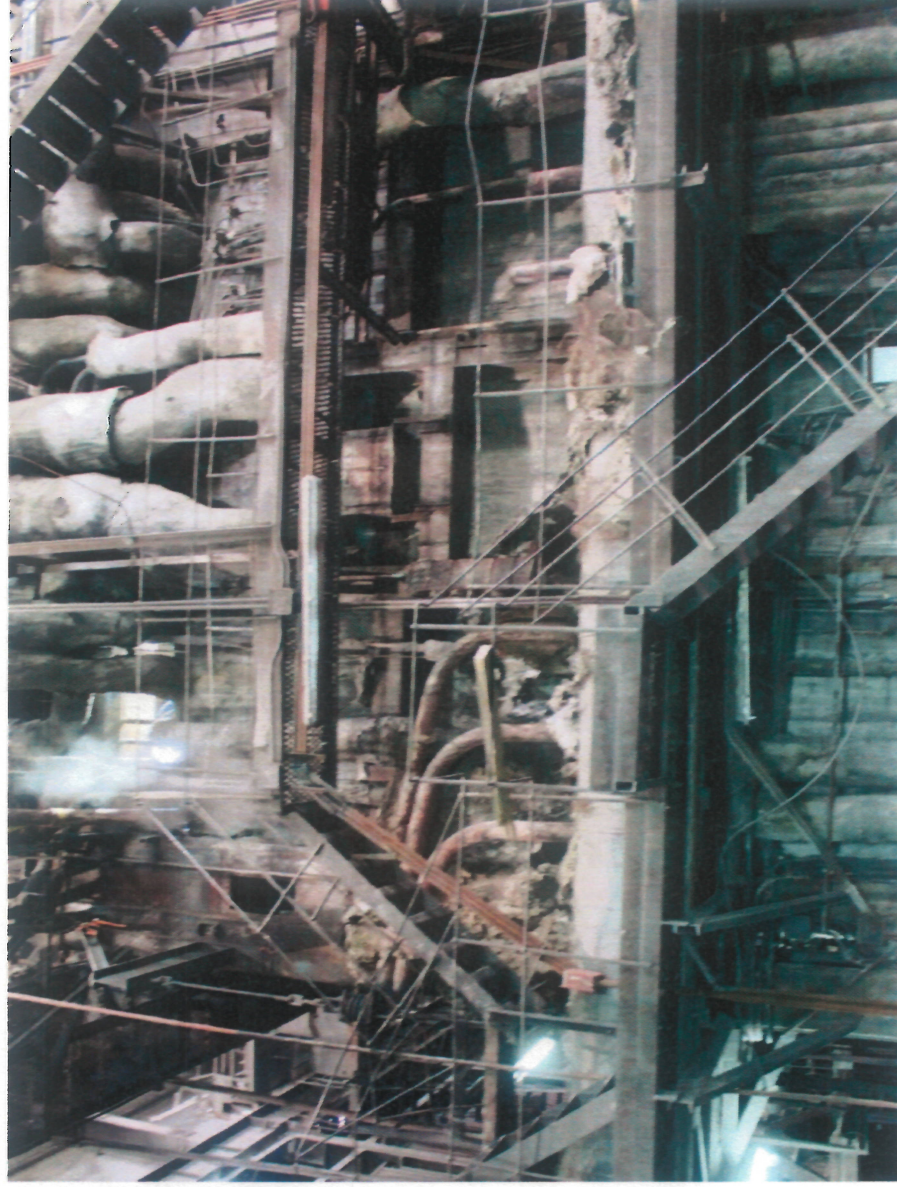

В процессе

**Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!**

