

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года**

**ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии), утверждена совместным приказом ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО" и Департамента  
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 21 декабря 2020 года 172-ОД**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч.:</b>			<b>1 059 965</b>	<b>285 553</b>	
<b>I</b>	<b>Строительство (расширение)</b>	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промшленная, д. 2		<b>241 332,23</b>	<b>10 717</b>	
1.1	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2021г	50 000,00	707	<i>В процессе</i>
1.2	<i>Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной</i>		2021г	191 332,23	10 010	<i>В процессе</i>
<b>II</b>	<b>Модернизация и Реконструкция</b>			<b>322 300,00</b>	<b>254 402</b>	
2.1	<i>Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО "УК ТЭЦ"</i>		2021г	12 000,00	12 500	<i>В процессе</i>
2.2	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2021г	310 300,00	241 902	<i>В процессе</i>
<b>III</b>	<b>Капитальные ремонты (увеличение срока службы)</b>			<b>496 332,36</b>	<b>20 434</b>	
3.1	<i>Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водопускных труб</i>		2021г	220 830,36	20 434	<i>В процессе</i>
3.2	<i>Капитальный ремонт к/а ст. № 15 с заменой конвективного пароперегревателя 1 ступени</i>		2021г	275 502,00	0	

Примечание: - В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» подготовлена корректировка утвержденной Инвестиционной программы на 2021 год



**ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»**  
**Информация о ходе исполнения**  
**Инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года**

## Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата



В процессе



В процессе

Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.

Выполнена замена участка магистрального паропровода от задвижки В I-1 до задвижки В I-3, подключение котлоагрегата ст.№11 и гиб на турбоагрегате ст.№9, заменен участок подключения котлоагрегата ст.№13 к паровой магистрали. На стадии завершения подключение котлоагрегата ст.№14 к паровой магистрали и наложение тепловой изоляции.

Замена паропровода позволит:

- снизить риск получения травм персоналом при эксплуатации паропровода.
- снизить риск недовыработки тепловой и электрической энергии.
- снизить риск повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;

## Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной



В процессе



В процессе



В процессе

Выполнен монтаж кабельных лотков и монтаж силового кабеля, выполнена топографическая съёмка, проведено испытание кабеля, выполнена планировка грунта и восстановление дорожного покрытия.


Замена позволит:

- Обеспечить надежное электрическое питание и снизить риск аварийного отключения береговой насосной.
- Обновление физически устаревшего оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. 3

## Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водоопускных труб



**В процессе**

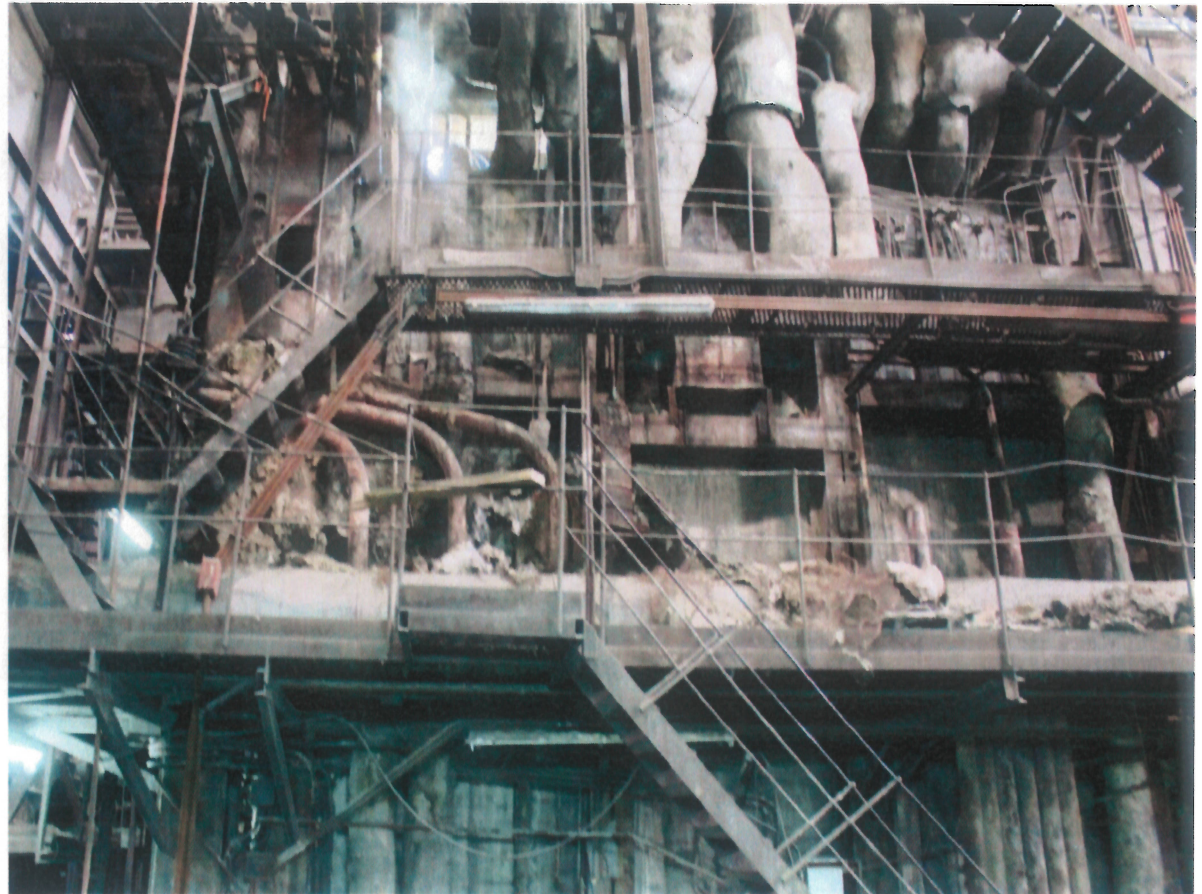

**В процессе**

**Выполнен демонтаж тепловой изоляции и демонтаж водоопускных труб.  
В процессе монтаж водоопускных труб.**

Замена позволит:

- Обеспечить надежную и безаварийную работу котлоагрегата в отопительный период.
- Снизить риск получения травм персоналом при обслуживании котлоагрегата.

**Назарларыңызға рахмет!  
Спасибо за внимание!**

