

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 6 месяцев 2022 года  
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 22 декабря 2021 года №304-ОД и Управления  
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 27 декабря 2021 года №114**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года, в т.ч.:</b>			<b>1 700 589</b>	<b>81 176</b>	
<b>I</b>	<b>Строительство (расширение)</b>	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 2		<b>800 000</b>	<b>1 459</b>	
1.1	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2022г	800 000	1 459	<i>В процессе</i>
<b>II</b>	<b>Модернизация и Реконструкция</b>		2022г	<b>589 553</b>	<b>0</b>	
2.1.	<i>Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2022г	9 500	0	<i>В процессе</i>
2.2.	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2022г	328 918	0	<i>В процессе</i>
2.3.	<i>Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди</i>		2022г	127 265	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>
2.4.	<i>Замена трубопроводов сетевой воды V очереди</i>		2022г	123 870	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>
<b>III</b>	<b>Капитальные ремонты (увеличение срока службы)</b>		2022г	<b>311 036</b>	<b>79 717</b>	
3.1.	<i>Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9</i>		2022г	56 388	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.2.	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>		2022г	136 538	79 717	<i>В процессе</i>
3.3.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 замена бокового экрана (левый, правый)</i>		2022г	57 757	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.4.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№14 с заменой ширмового пароперегревателя</i>		2022г	60 353	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы на 2022 год в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»

## Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата




Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.

В процессе демонтажные работы (демонтаж тепловой изоляции, паропровода и обетвонирование неподвижных опор).

Цель:

- Замена отработавшего свой ресурс паропроводов.
- Снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации паропровода;
- Снижение риска повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;
- Увеличение расчетного ресурса со 100 000 часов на 200 000 часов.
- Увеличение пропускной способности магистральных паропроводов.
- Реконструкция опорно-подвесной системы.

## Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди.

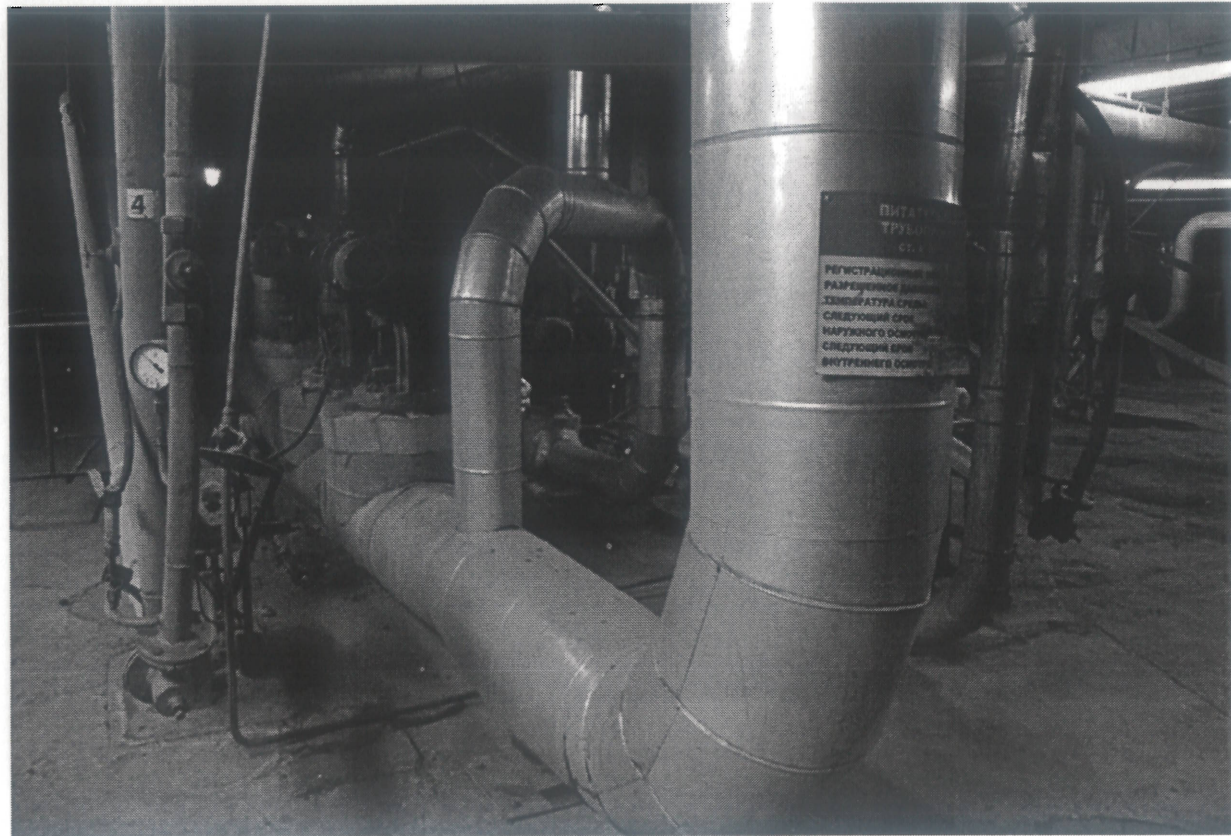

Замена питательного трубопровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.  
На сегодняшний день ожидается поставка материала и оборудования.

Цель :

- Замена отработавшего свой ресурс трубопроводов;
- Снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации трубопровода;
- Снижение риска недовыработки тепловой и электрической энергии.

## Капитальный ремонт золопроводов



**Завершены работы на золопроводе №3, выполнен частичный монтаж компенсаторов.  
В процессе демонтажно-монтажные работы на золопроводе №2.**

Цель :

- Повышение надежности работы станции;
- Снижение риска останова основного оборудования из-за порыва золопроводов;
- Замена изношенных золопроводов (снижение износа);
- Повышение экологической безопасности (снижение вероятности проливов золошлаковой пульпы).
