

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 9 месяцев 2022 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 22 декабря 2021 года №304-ОД и Управления
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 27 декабря 2021 года №114**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года, в т.ч.:			1 700 589	466 673	
I	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 2		800 000	1 504	
1.1	<i>Строительство нового золотвала</i>		2022г	800 000	1 504	<i>В процессе</i>
II	Модернизация и Реконструкция		2022г	589 553	334 015	
2.1.	<i>Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2022г	9 500	9 500	<i>Выполнено</i>
2.2.	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2022г	328 918	243 341	<i>В процессе</i>
2.3.	<i>Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди</i>		2022г	127 265	81 174	<i>В процессе</i>
2.4.	<i>Замена трубопроводов сетевой воды V очереди</i>		2022г	123 870	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2022г	311 036	131 154	
3.1.	<i>Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9</i>		2022г	56 388	31 900	<i>В процессе</i>
3.2.	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>		2022г	136 538	99 254	<i>В процессе</i>
3.3.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 замена бокового экрана (левый, правый)</i>		2022г	57 757	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.4.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№14 с заменой ширмового пароперегревателя</i>		2022г	60 353	0	<i>Не подошел срок выполнения</i>

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы на 2022 год в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»

Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата



Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.


В 2022г запланирована замена участков паропроводов с выводом котлоагрегатов ст.№№11,12,13.

В процессе монтажные работы.

Цель:

- Замена отработавшего свой ресурс паропроводов.
- Снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации паропровода;
- Снижение риска повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;
- Увеличение расчетного ресурса со 100 000 часов на 200 000 часов.
- Увеличение пропускной способности магистральных паропроводов.
- Реконструкция опорно-подвесной системы.

Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди.

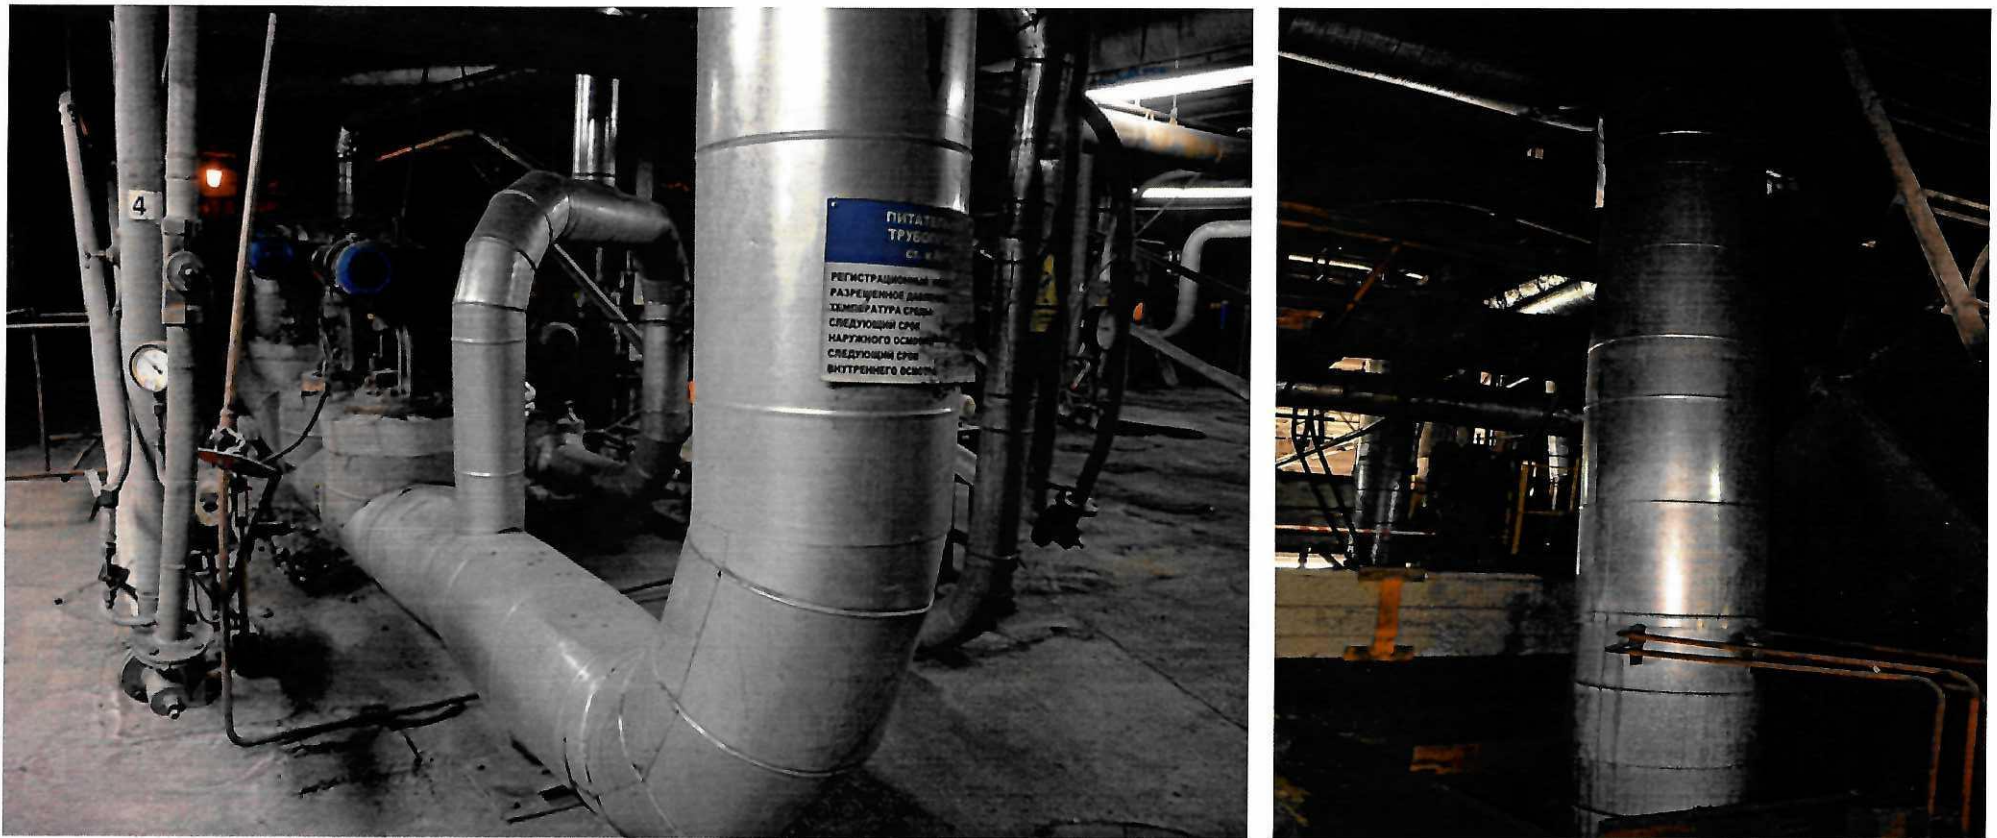

Замена питательного трубопровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.
В 2022г запланирована замена участков питательного трубопровода котлоагрегата ст.№12.
Работы завершены.

Цель :

- Замена отработавшего свой ресурс трубопроводов;
- Снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации трубопровода;
- Снижение риска недовыработки тепловой и электрической энергии.

Замена завихрителей эмульгаторов котлоагрегата ст.№10




На сегодняшний день выполнена поставка блоков завихрителей, в количестве 2-х штук.

Цель :

- Повышение надежности работы станции;
- Обеспечение бесперебойной и эффективной работы золоулавливающей установки;
- Улучшение КПД котлоагрегата.

Капитальный ремонт золопроводов

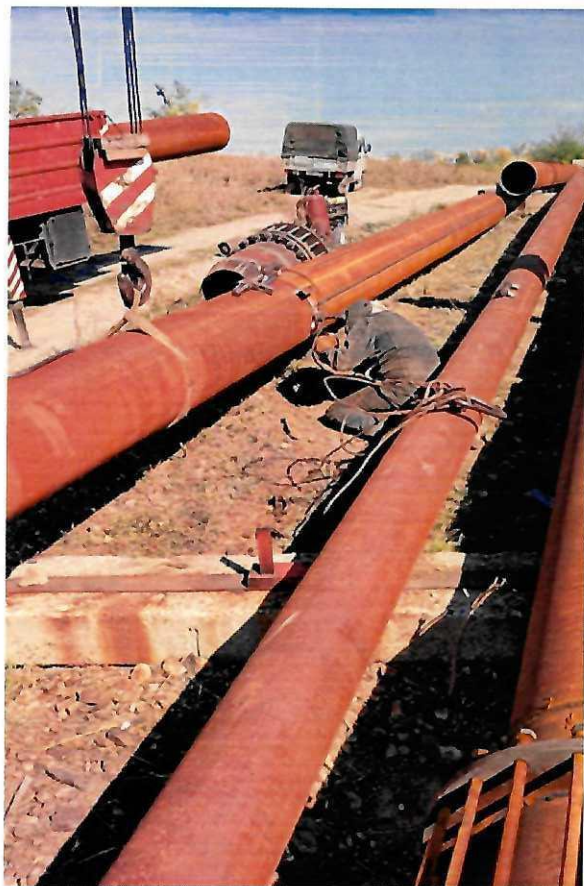

Работы завершены.

Цель :

- Повышение надежности работы станции;
- Снижение риска останова основного оборудования из-за порыва золопроводов;
- Замена изношенных золопроводов (снижение износа);
- Повышение экологической безопасности (снижение вероятности проливов золошлаковой пульпы).
