Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 9 месяцев 2026 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 22.06.2026г №62-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 22.06.2026г года №52

№	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на 2026 год			**6 692 177,11**	**3 436 528,77**	
1	Реконструкция II-IV очереди здания главного корпуса	ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.промышленная, д 2	*2026г*	*1 548 860,75*	*920 282,79*	*В процессе*
2	Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди		*2026г*	*400 000,00*	*0,00*	*Не подошел срок*
3	Реконструкция АСУ ТП котлоагрегата ст.№14		*2026г*	*224 785,71*	*0,00*	*В процессе*
4	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7 с заменой воздухоподогревателя 1,2 ступени		*2026г*	*165 642,17*	*185 565,56*	*В процессе*
5	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой водяного экономайзера 1 ступени		*2026г*	*541 561,11*	*832 793,75*	*В процессе*
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой фронтового экрана		*2026г*	*566 540,94*	*0,00*	*Не подошел срок*
7	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароперепускных труб от ВПП к ПСК		*2026г*	*63 107,25*	*50 705,33*	*В процессе*
8	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароохладителя 2 ступени		*2026г*	*78 659,47*	*94 953,34*	*В процессе*
9	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой холодного пакета пароперегревателя		*2026г*	*257 939,52*	*0,00*	*Не подошел срок*
10	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой пароохладителя 1 ступени		*2026г*	*78 659,47*	*63 331,86*	*В процессе*
11	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой задних блоков потолочного пароперегревателя		*2026г*	*41 763,26*	*112 418,82*	*В процессе*
12	Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода		*2026г*	*1 984 060,00*	*574 782,78*	*В процессе*
13	Капитальный ремонт золопроводов		*2026г*	*283 425,94*	*150 917,00*	*В процессе*

Реконструкция II-IV очереди здания главного корпуса

Основной целью реконструкции II-IV очереди здания главного корпуса является устранение аварийного состояния строительных конструкций покрытия здания и обеспечение сейсмобезопасности. Реализация проекта рассчитана на 3 этапа начиная с 2025 по 2027 годы. В 2026 году выполняется реализация 2 этапа.

В рамках реализации проекта выполняются следующие работы: демонтаж с заменой кирпичных стен, на сэндвич-панели; вынос сетей, коммуникаций на демонтируемых стенах; демонтаж с заменой плит покрытия кровли на сэндвич; устройство ж/б монолитного цокольного пояса; демонтаж (монтаж) окон.






Замена ПТК АСУ ТП котлоагрегата ст.№14

Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессов котлоагрегата ст.№14 позволит обеспечить повышение уровня безопасности и безаварийности технологического процесса, требуемую точность, достоверность и своевременность предоставляемой персоналу оперативной информации. На сегодняшний день все работы завершены.




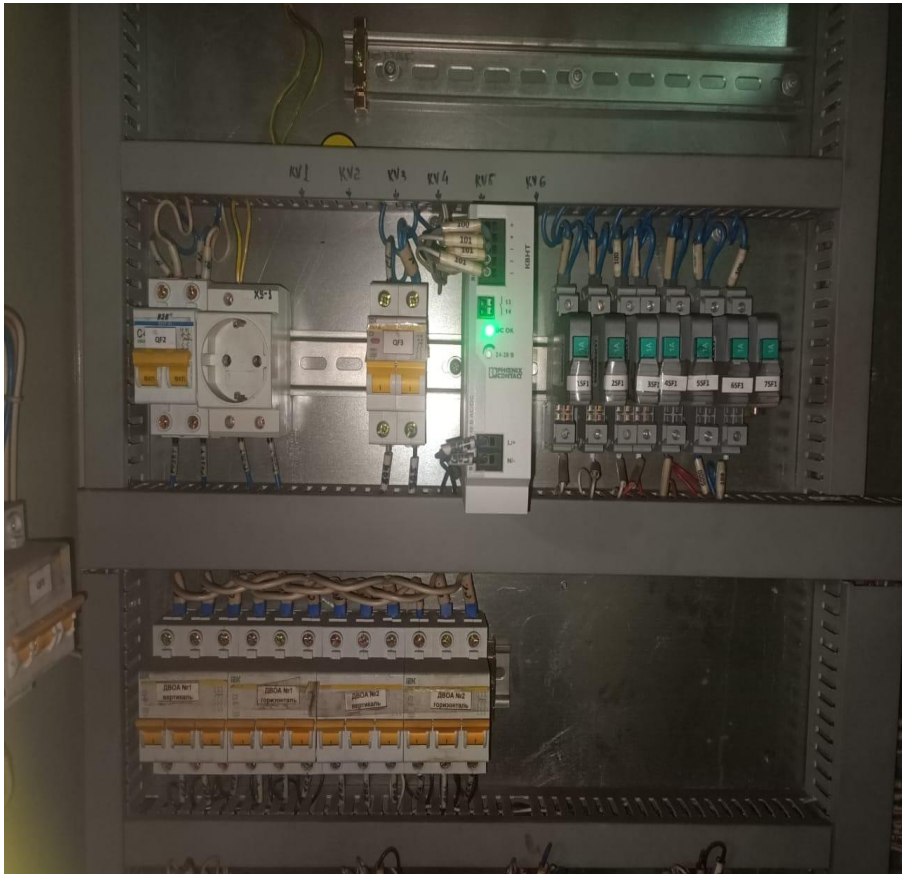

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7 с заменой воздухоподогревателя, пароперегревателя выполнен в полном объеме. Произведена замена кубов холодной, подогретой и горячей части воздухоподогревателя, а также первой и второй ступени пароперегревателя общим весом 63,5 тонн.




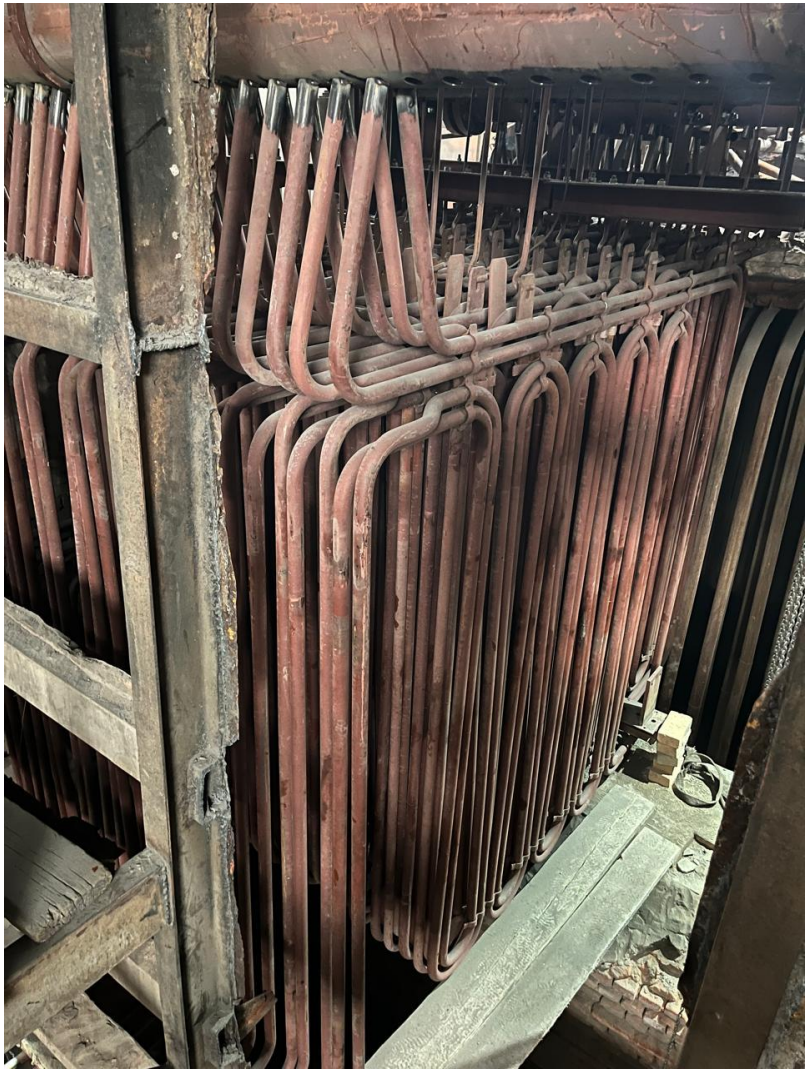

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой водяного экономайзера 1 ступени выполнен в полном объеме. Произведена замена пакета змеевиков водяного экономайзера общим весом 58,5 тонн.




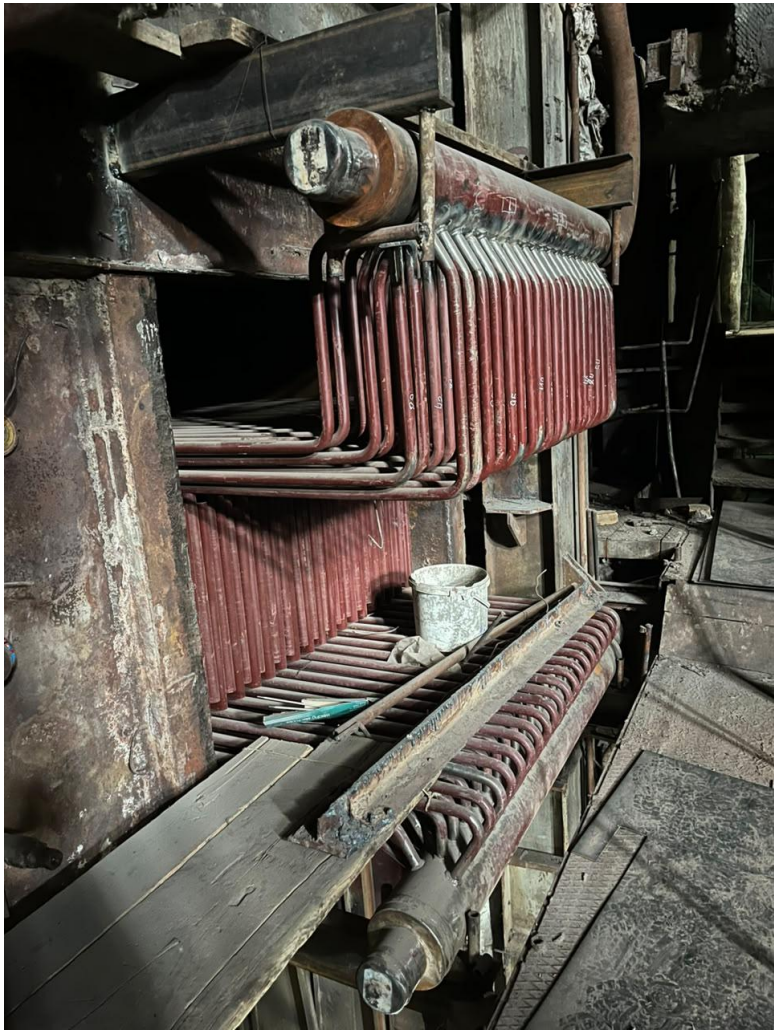

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к ПСК, пароохладителя 2 ступени выполнен в полном объеме. Общий вес замененного оборудования составил 9,5 тонн.



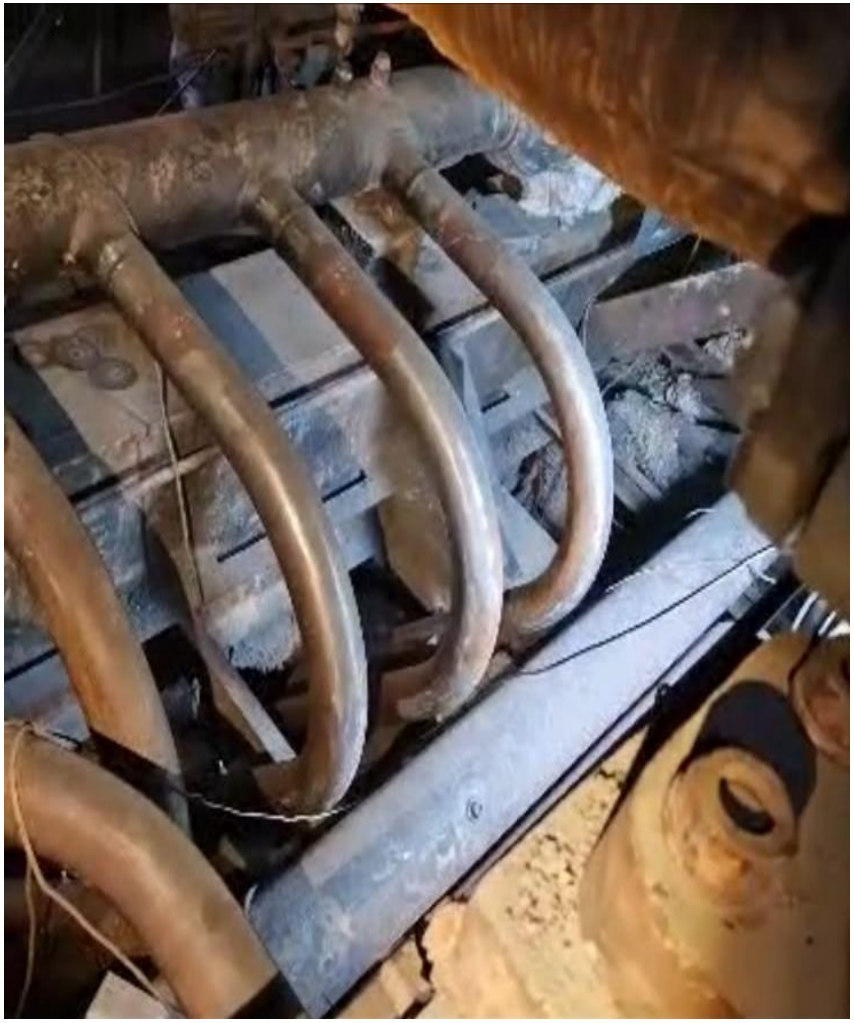

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13


Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой пароохладителя 1 ступени выполнен в полном объеме. Общий вес замененного оборудования составил 3,1 тонн.






Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14


Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой задних блоков потолочного пароперегревателя выполнен в полном объеме. Общий вес замененного оборудования составил 7,5 тонн.

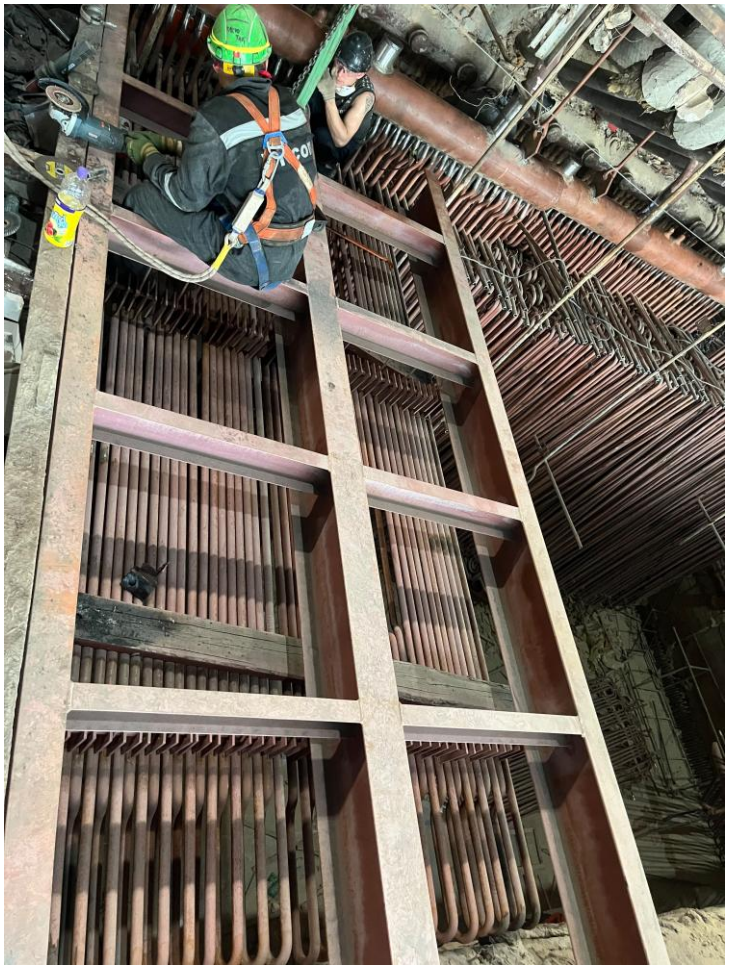

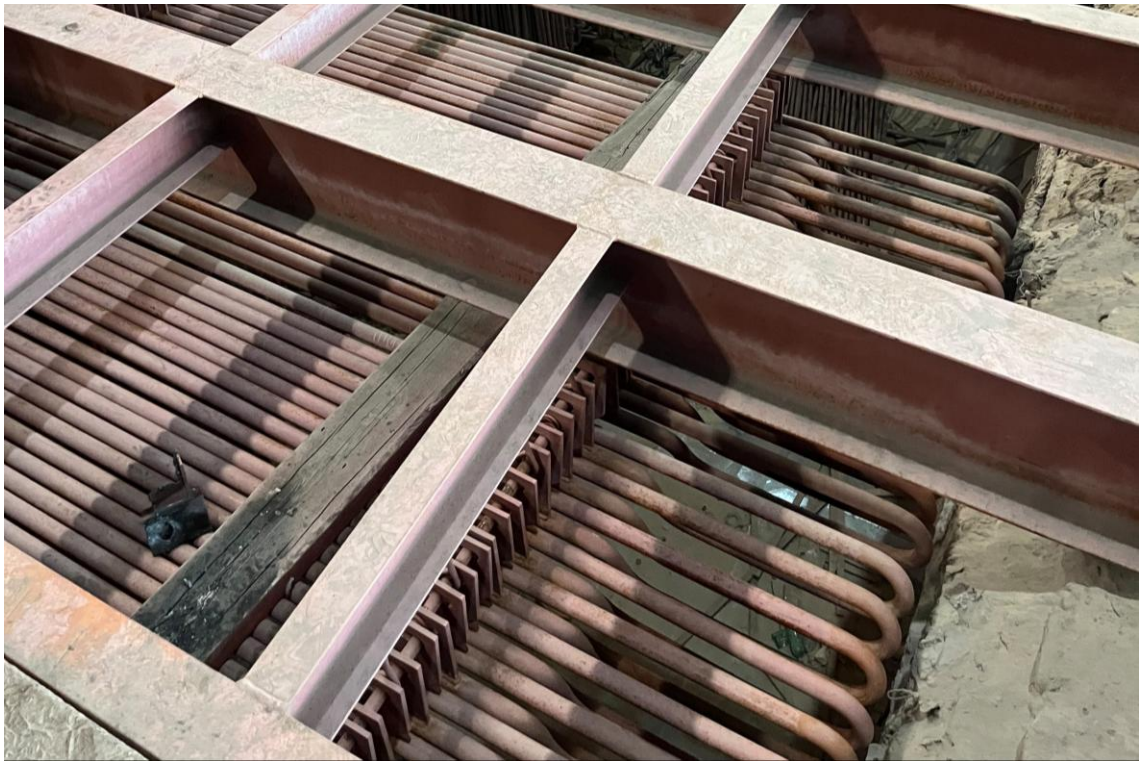

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой паропроводов от КПП-2 к ПСК выполнен в полном объеме. Общий вес замененного оборудования составил 19,3 тонн.

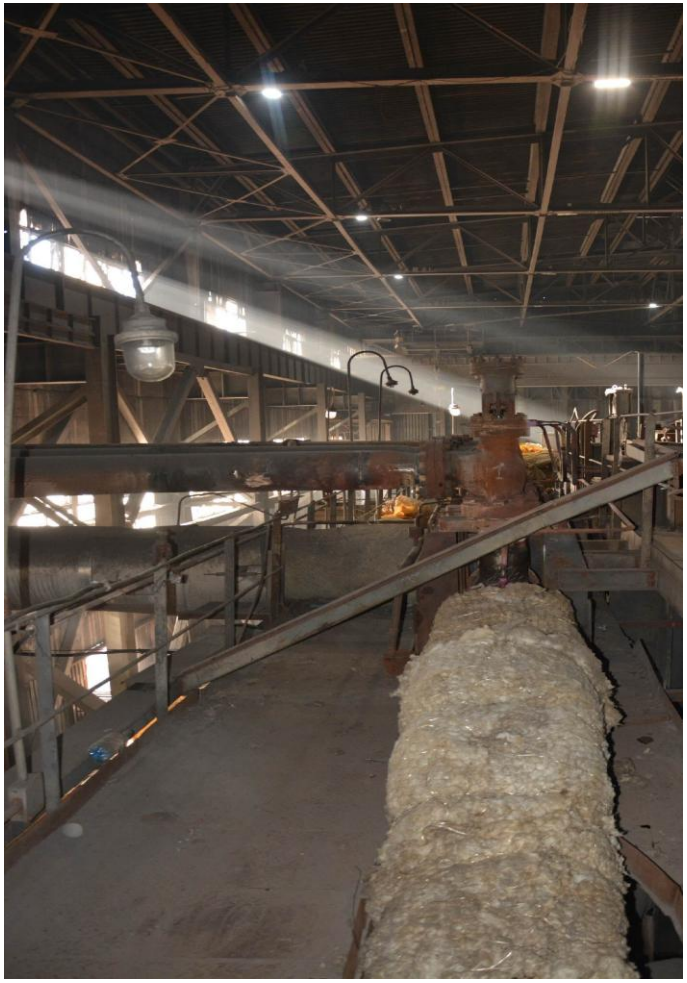




Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода

Основной целью капитального ремонта сетей подземного промышленного водовода 2Д1000 мм является увеличение паркового ресурса, увеличение надежности и безопасности. Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода выполняется по участкам и разделена на 4 этапа.

В 2026 году выполняются работы в рамках 2 этапа.

Выполнены работы по разработке камер для внутренней очистки трубопроводов для последующей прокладки лайнера. Также выполнена санация трубопровода полимерно-композитным рукавом – лайнером «BTP - Liner, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) воздействия.



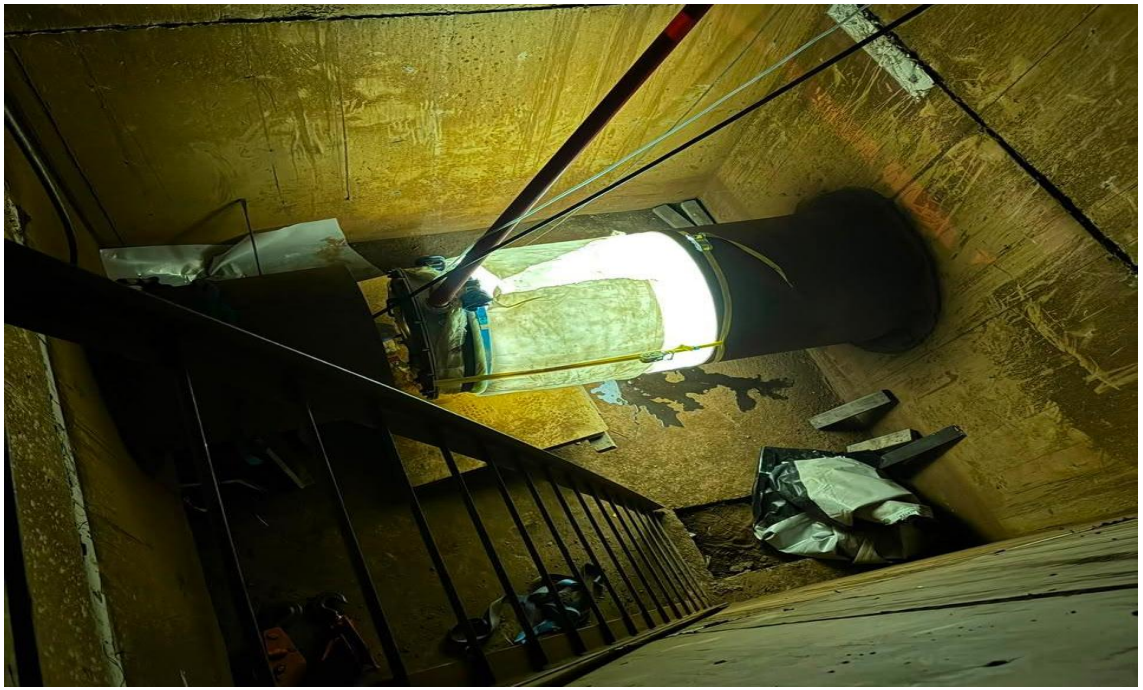

Капитальный ремонт золопроводов

Работы по капитальному ремонту золопроводов завершены. Произведена замена участков золопровода №1, №2 Ø530мм общей протяженностью 320м, золопровода №3 Ø325мм общей протяженностью 1850м, так же произведена замена полиэтиленового золопровода №1 с Багерной насосной №1 на багерную насосную №3 протяженностью 105м.



